КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · 14 ОКТЯБРЯ 2026

ТЕСТОВОЕ КП НА ОРГАНИЗАЦИЮ КОРПОРАТИВНОГО КЭМПА

КЛИЕНТ

ТЕСТОВАЯ КОМПАНИЯ

Имя Фамилия, HR-директор

ОСНОВНОЙ КОНТАКТ

MEDIAN AGENCY

Отдел проектов

@medianprojects +7 (862) 291-25-52 info@median.agency

Актуально до	13.11.2026
Срок	35 дней
Этапы	3 этапа
Стоимость	1 780 000 ₽

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ↓

СМЕТА В EXCEL ↓

СКАЧАТЬ ВСЁ АРХИВОМ ↓

Что входит

- Концепция и айдентика кэмпа
- Площадка, проживание и трансфер
- Программа на 2 дня
- Проведение и пост-отчёт

ЗАДАЧА

Тестовая страница для проверки раздела. Выездной кэмп на 150 человек: два дня в горах, деловая программа, вечерние активности и командные форматы.

Последовательность

Сначала концепция и площадка, затем программа и подготовка, в конце — проведение и отчёт.

ЭТАПЫ И СМЕТА

01

ЭТАП 1

КОНЦЕПЦИЯ И ПЛОЩАДКА

Описание	Идея кэмпа, айдентика, подбор и бронирование площадки и проживания.
Результат	Утверждённая концепция, ключевой визуал, договор с площадкой.

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
Концепция и айдентика	1 усл.	250 000	250 000
Подбор площадки	1 усл.	60 000	60 000

10 ДНЕЙ

310 000 ₽

02

ЭТАП 2

ПРОГРАММА И ПОДГОТОВКА

Описание	Деловая и вечерняя программа, спикеры, логистика, регистрация участников.
Результат	Программа, регистрация, план логистики.

20 ДНЕЙ

600 000 ₽

03

ЭТАП 3

ПРОВЕДЕНИЕ И ОТЧЁТ

Описание	Техника, команда на площадке, трансфер, фото и видео.
Результат	Проведённый кэмп и отчёт с фото и видео.

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
Звук, свет, видео	1 компл.	450 000	450 000
Трансфер	3 автобус	40 000	120 000
Команда на площадке	8 чел.	15 000	120 000
Фото- и видеосъёмка	1 усл.	180 000	180 000

5 ДНЕЙ

870 000 ₽

ИТОГОВЫЙ СРОК
И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

35 ДНЕЙ
1 780 000 ₽


СТОИМОСТЬ УКАЗАНА В РУБЛЯХ БЕЗ НДС
РАСЧЁТ АКТУАЛЕН ДО 13 НОЯБРЯ 2026 ГОДА

ГРАФИК РАБОТ

Ориентировочный график при старте 2 ноября 2026 года. Паузы на согласования и ожидание материалов учитываются отдельно.


01 · КОНЦЕПЦИЯ И ПЛОЩАДКА

10 ДНЕЙ · 2 НОЯБРЯ — 11 НОЯБРЯ



02 · ПРОГРАММА И ПОДГОТОВКА

20 ДНЕЙ · 12 НОЯБРЯ — 1 ДЕКАБРЯ

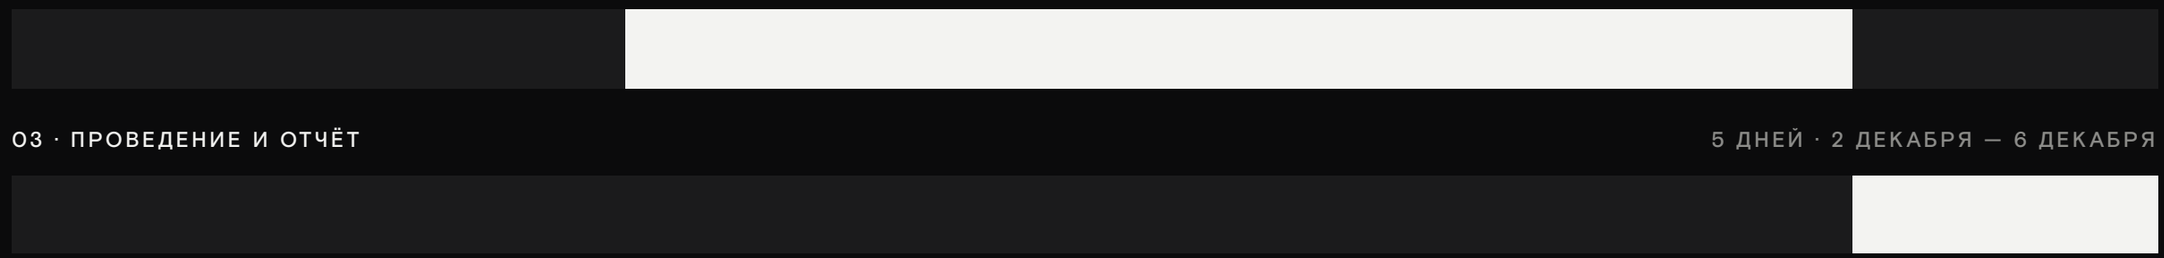

03 · ПРОВЕДЕНИЕ И ОТЧЁТ

5 ДНЕЙ · 2 ДЕКАБРЯ — 6 ДЕКАБРЯ

СТАРТ 2 НОЯБРЯ 2026

ОКОНЧАНИЕ 6 ДЕКАБРЯ 2026

РЕЛЕВАНТНЫЙ

ОПЫТ



SOUTH HUB

2022–2026

Пять лет делаем закрытый кэмп для C-level в IT — от концепции до проведения.



SNOW BASE

2026

Зимний кэмп для лидеров в AI, продуктах и технологиях

ФОРМАТ РАБОТЫ

Договор и оплата	Подписываем договор и приложение со сметой на каждый этап. Каждый этап предоплачивается перед стартом.
Процесс	В конце каждого этапа показываем результат, фиксируем решения и переходим к следующей части проекта.
Дополнительный объём	Новые задачи оцениваются отдельно по составу, стоимости и срокам. При изменении объёма смета пересчитывается.

КОМАНДА ПРОЕКТА

ОСНОВНОЙ КОНТАКТ

MEDIAN AGENCY

Отдел проектов

@medianprojects +7 (862) 291-25-52

info@median.agency

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Менеджер проекта

@medianprojects +7 (862) 291-25-52

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Аккаунт-директор

@medianprojects info@median.agency

ОБСУДИМ ПРОЕКТ?

→ info@median.agency @medianprojects +7 (862) 291-25-52 Median Agency · Отдел проектов

© Median Agency 2026

Предложение подготовлено лично для вас. Пожалуйста, не публикуйте ссылку.
